

# **GAS NATURAL**

**PARA TODOS LOS CORDOBESES**


# **SISTEMA**

---

# **SIERRAS CHICAS**

**ACTO DEL DÍA: HABILITACIÓN  
RAMAL DE ALIMENTACIÓN Y PLANTA REDUCTORA DE PRESIÓN  
DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN**

# ▶ SISTEMA SIERRAS CHICAS

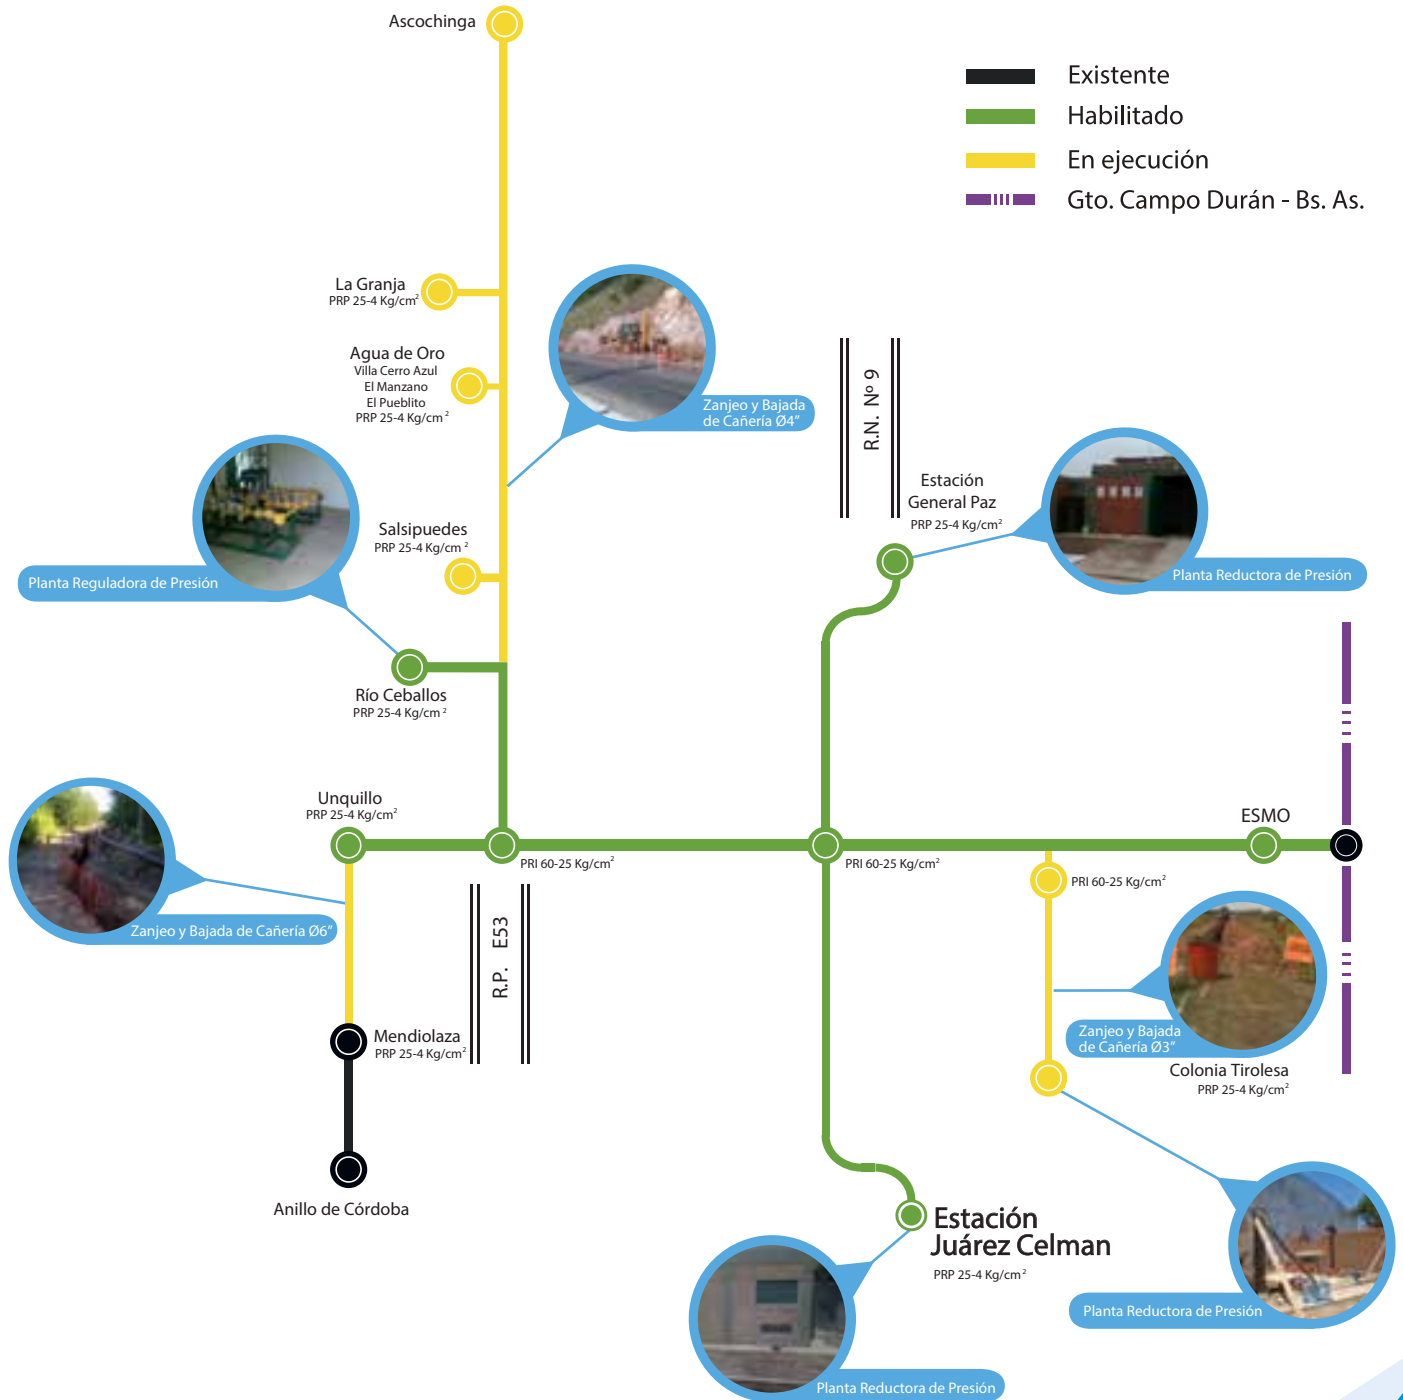

## ➤ SISTEMA SIERRAS CHICAS

OBRA: RAMALES Y P.R.P. EST. GENERAL PAZ, EST. JUÁREZ CELMAN Y COLONIA TIROLESA

### DATOS GENERALES

- Monto de Obra: \$ 23.754.336
- Contratista: PAMAR S.A.C.I.F.I. y A.
- Plazo de obra: 9 meses
- Beneficiarios: 22.000 Habitantes
- 4 Instalaciones de superficie
- 21,18 Km de Ramales

### SITUACIÓN ACTUAL

- 100% Cañería Adquirida
- 100% Ingeniería Desarrollada
- Habilitado Ramales y P.R.P. Est. Gral. Paz y Estación Juárez Celman
- En Ejecución Ramal, P.R.I. y P.R.P. Colonia Tirolesa

### ACTO DEL DÍA

HABILITACIÓN PARCIAL DE RAMAL DE ALIMENTACIÓN Y P.R.P. DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN

- Monto: \$ 10.141.851
- 1 Planta Reductora de Presión 25-4 Kg/cm<sup>2</sup>
- 14.000 Habitantes Beneficiados
- 9,40 Km de Ramales

## ➤ SISTEMA SIERRAS CHICAS

**OBRA: RAMALES Y P.R.P. SALSIPUEDES – AGUA DE ORO – EL MANZANO – VILLA CERRO AZUL  
EL PUEBLITO – LA GRANJA – ASCOCHINGA**

### DATOS GENERALES

- Monto de Obra \$ 59.488.577
- Contratista: ACLADE S.R.L. - GYHB S.A. - UTE
- Plazo de obra: 18 meses
- Beneficiarios: 16.000 Habitantes
- 3 Instalaciones de superficie
- 17,79 Km de Ramales
- 10,50 Km de PEAD

### SITUACIÓN ACTUAL

- Cañería de Acero 100% Adquirida
- 50% Ingeniería Desarrollada
- Obra en ejecución

**OBRA: RAMAL UNQUILLO - MENDIOLAZA**

### DATOS GENERALES

- Monto de Obra \$ 10.899.423
- Contratista: ACLADE S.R.L - GYHB S.A. - UTE
- Plazo de Obra: 9 meses
- Beneficiarios: 16.000 Habitantes
- 4,50 Km de Ramales

### SITUACIÓN ACTUAL

- Cañería de Acero 100% Adquirida
- 100% Ingeniería Desarrollada
- Obra en ejecución
